

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 81. 322
Borested : Enegårdsvej 2
8444 Balle

Kommune : Syddjurs
Region : Midtjylland

Boringsdato : 24/7 2013

Boringsdybde : 63 meter

Terrænkote : 26.67 meter o. DNN

Brøndborer : Brandevejens Vandteknik

MOB-nr :

BB-journr :

BB-bornr :

Prøver

- modtaget :

- beskrevet :

- antal gemt :

Formål : Vandværksboring

Anvendelse : Vandværksboring

Boremethode : Tørboring/slagboring

Kortblad : 1315 IISØ

UTM-zone : 32

UTM-koord. : 610638, 6242833

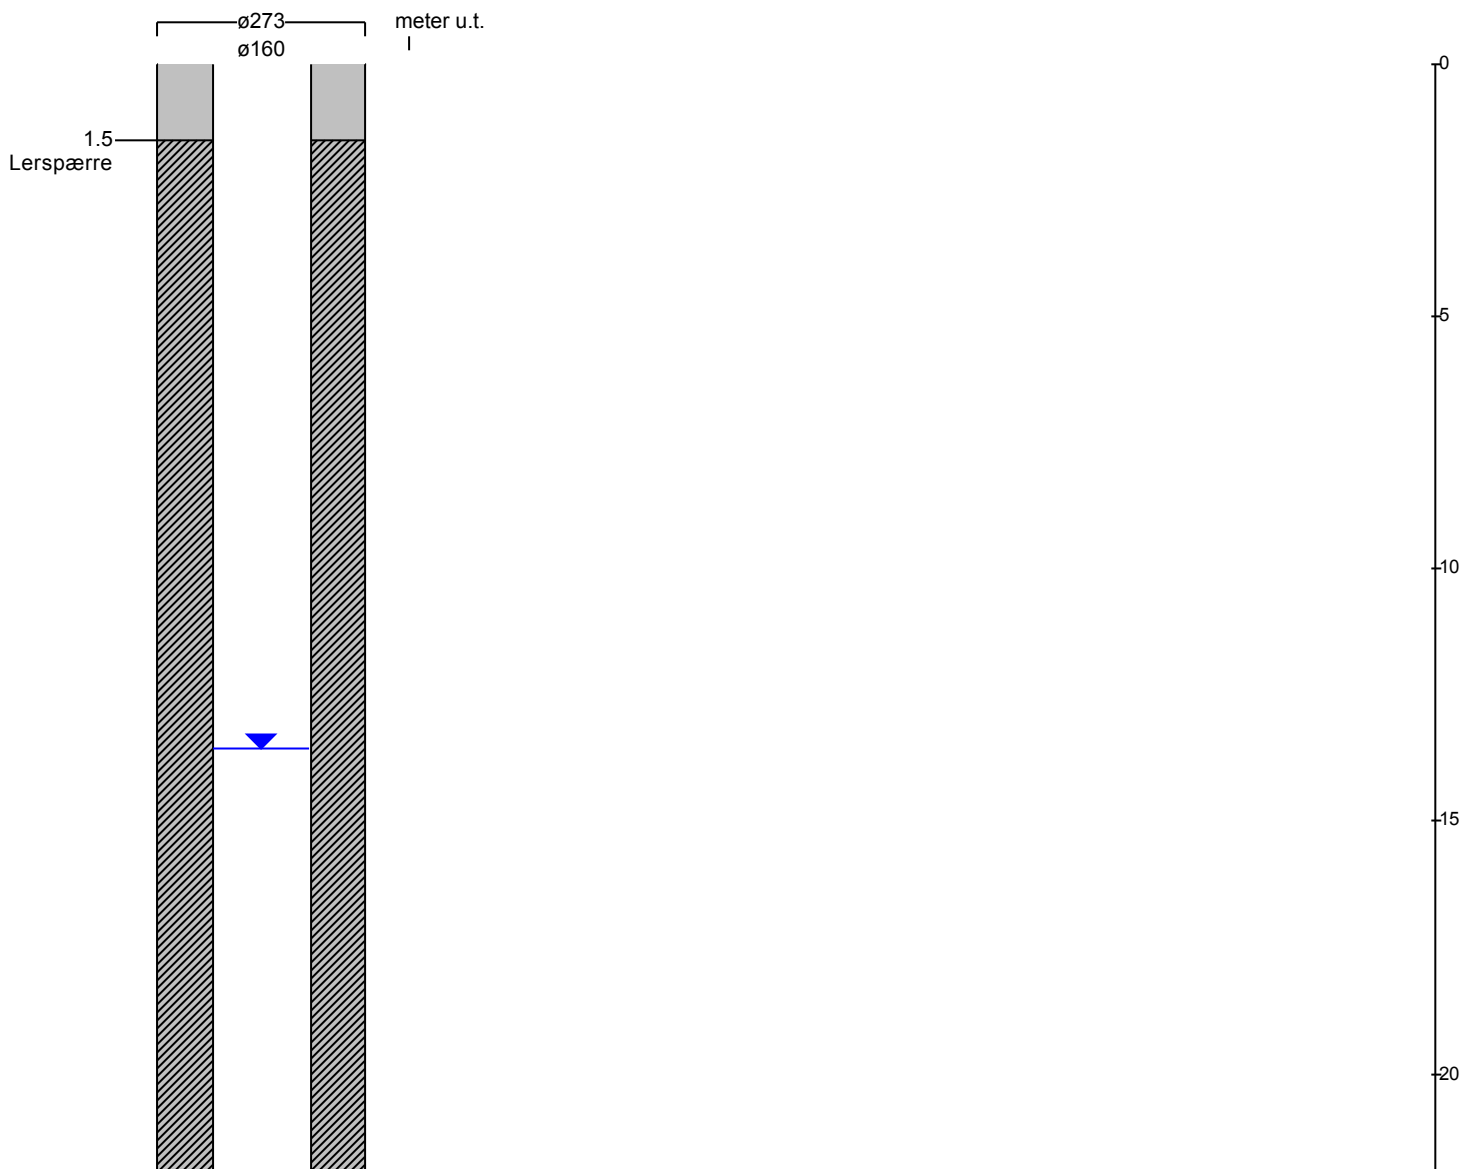
Datum : ED50

Koordinatkilde : Brøndborer

Koordinatmetode :

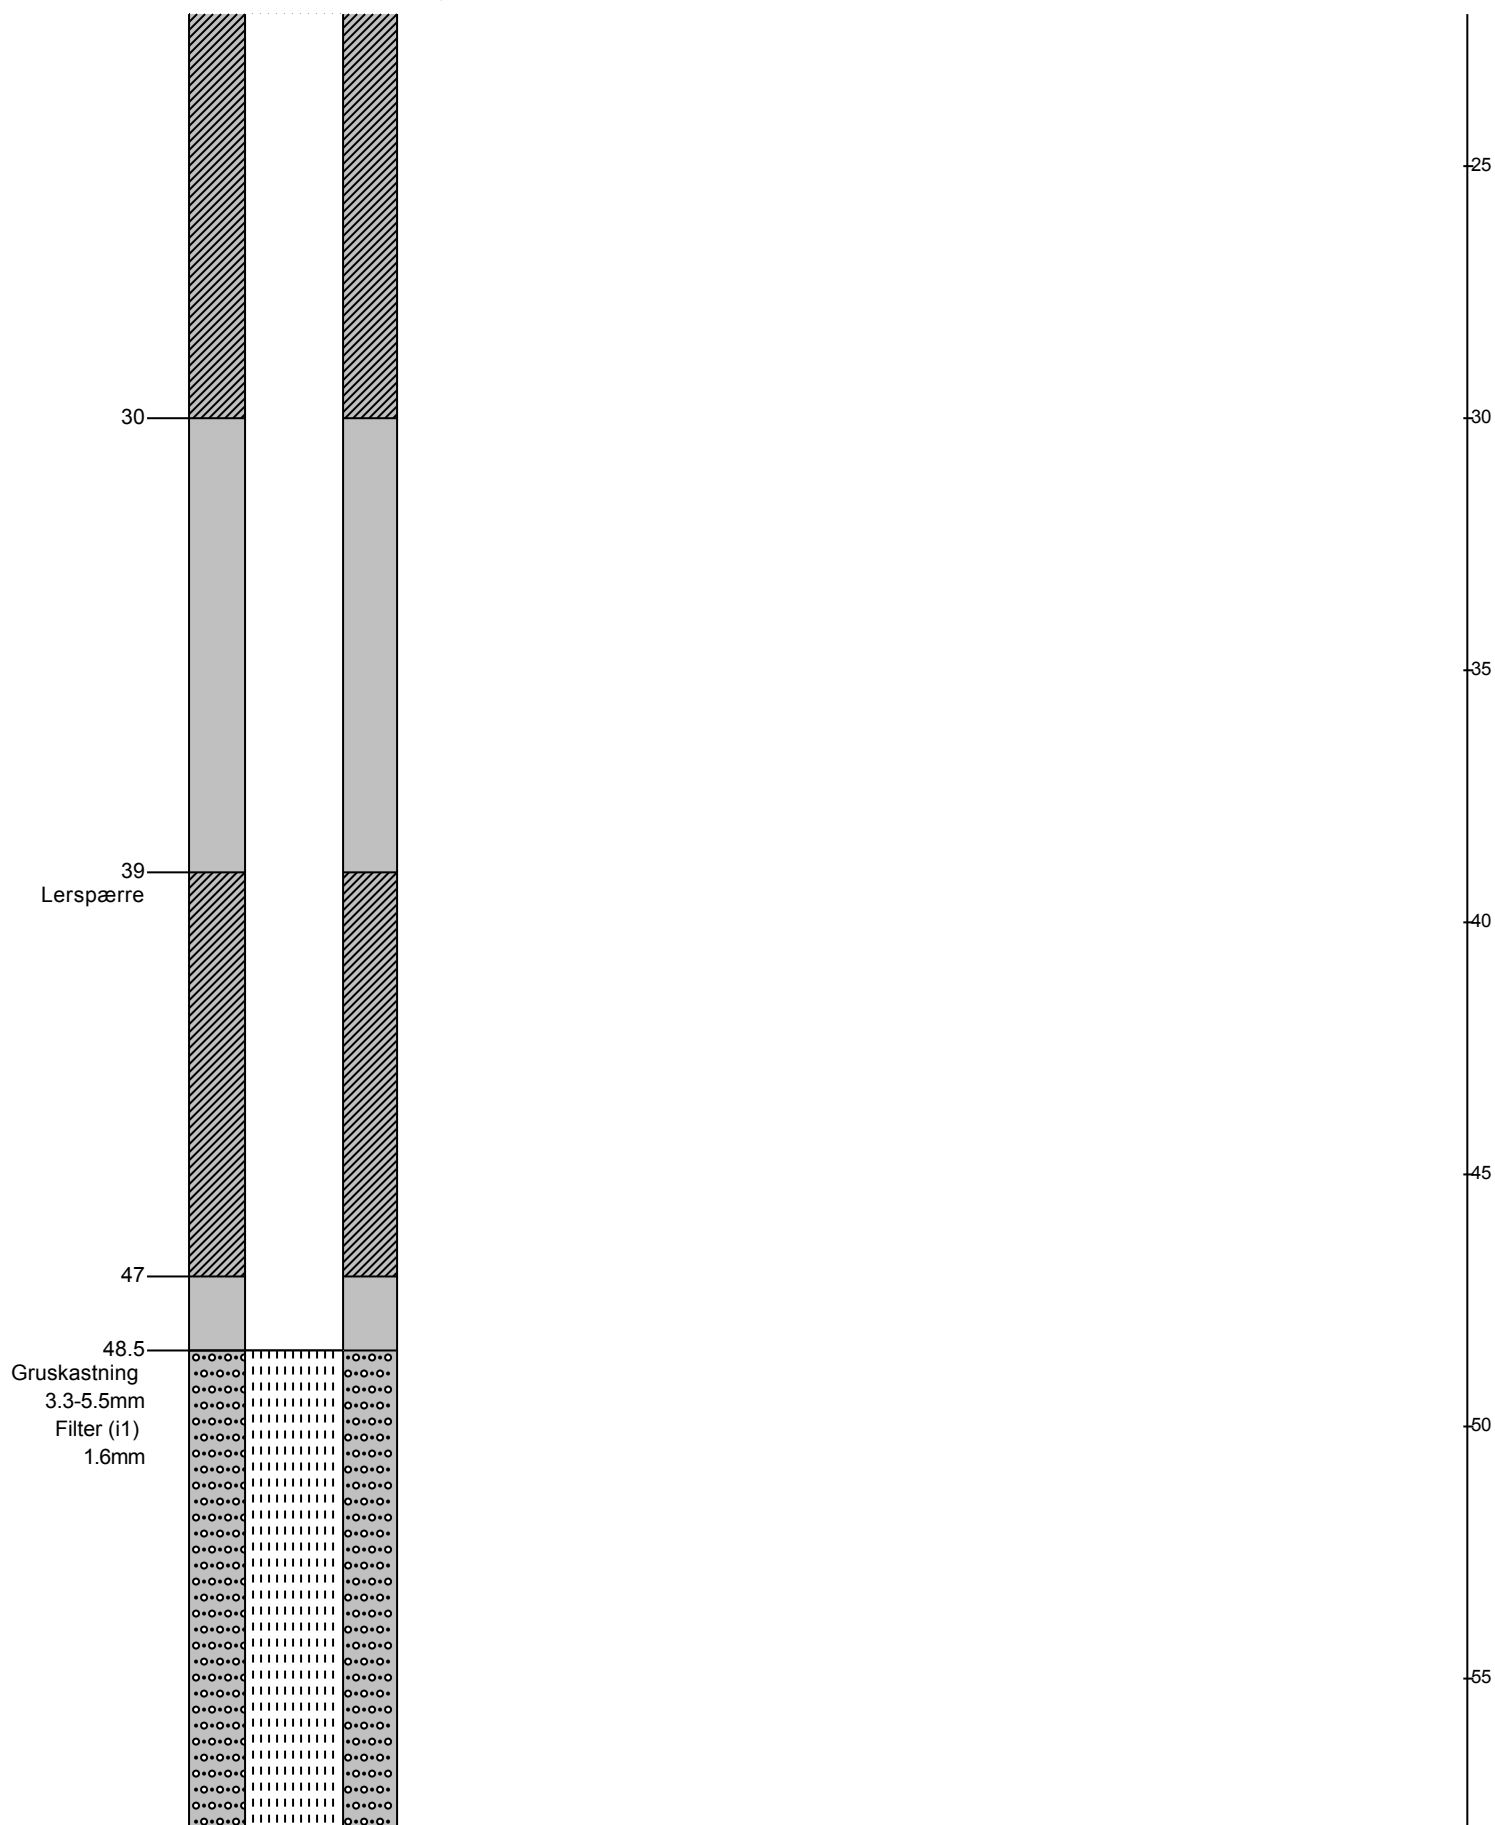
	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
Indtag 1 (seneste)	13.55 meter u.t.	24/7 2013	12 m ³ /t	0.18 meter	51 time(r)

Tilbagepejling

Indtag 1 Tid: 3min Vsp: 13.55m , Tid: 10min Vsp: 13.55m , Tid: 30min Vsp: 13.55m , Tid: 60min Vsp: 13.55m , Tid: 120min Vsp: 13.55m


BORERAPPORT

DGU arkivnr: 81. 322

meter u.t.
|


BORERAPPORT

DGU arkivnr: 81. 322

